

ALLEGATO "A"

Comune di Vergiate
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN LOCALE A PIANO TERRA DA ADIBIRE
A CENTRO PRELIEVI

COMMITTENTE: A.S.S.S.V..

CANTIERE: Via G. di Vittorio, 2, Vergiate (VA)

Vergiate, 29/05/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto De Dionigi Franco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Zanetta Giovanni)

Architetto De Dionigi Franco

Via Martiri di Belfiore, 45
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 3349514952-0331026300 - Fax: 0331-026300
E-Mail: studio@dedionigi.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE						
Presa di possesso dell'area di cantiere e realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	1	1	31/08/2020	31/08/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	1	2	2	01/09/2020	02/09/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	02/09/2020	02/09/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3	3	1	1	02/09/2020	02/09/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	6	4	1	1	03/09/2020	03/09/2020
Realizzazione di impianto idrico del cantiere e servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	4	3	1	1	03/09/2020	03/09/2020
Rimozione Impianti di Illuminazione, Ventilazione e Condizionamento	1	4	1	1	04/09/2020	04/09/2020
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1	1	1	1	07/09/2020	07/09/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	1	2	2	08/09/2020	09/09/2020
Ripresa intonaco esistente e rasatura nuova parete divisoria	8	1	2	2	09/09/2020	10/09/2020
Installazione e allaccio calorifero rimosso	1	3	1	1	11/09/2020	11/09/2020
Installazione e ripristino funzionamento punto luce vecchi ambulatori	1	4	1	1	14/09/2020	14/09/2020
Tinteggiatura di superfici interne vecchia attesa ambulatorio	8	1	1	1	15/09/2020	15/09/2020
Scavo a sezione obbligatoria	4	1	1	1	09/09/2020	09/09/2020
Rimozione parziale di pavimento e massetto sottostante	1	1	1	1	09/09/2020	09/09/2020
Perforazioni e scassi in elementi opachi	6	1	3	5	10/09/2020	14/09/2020
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	4	1	1	1	14/09/2020	14/09/2020
Realizzazione di rete di scarico acque nere	2	1	2	2	15/09/2020	16/09/2020
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)	4	3	1	1	15/09/2020	15/09/2020
Impermeabilizzazione di pareti controterra	4	1	1	1	16/09/2020	16/09/2020
Rinterro e rinfranco di scavo eseguito parzialmente a mano e a macchina	4	1	1	1	17/09/2020	17/09/2020
Assistenze murarie per impianti	6	1	2	2	15/09/2020	16/09/2020
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	1	2	2	17/09/2020	18/09/2020
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	2	2	21/09/2020	22/09/2020
Formazione di sottofondo e massetto per pavimenti interni	1	1	2	2	23/09/2020	24/09/2020
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata	6	2	7	11	25/09/2020	05/10/2020
Montaggio ponteggio di servizio per la formazione di canale di scarico aria e ventilazione gruppo di sollevamento	4	1	2	4	25/09/2020	28/09/2020
Assistenze murarie all'impianto di VMC e realizzazione impianto di esalazione gruppo di sollevamento acque nere	4	1	2	2	29/09/2020	30/09/2020
Montaggio di carter in lamiera preverniciata	4	1	1	1	01/10/2020	01/10/2020
Smontaggio ponteggio di servizio	4	1	1	1	02/10/2020	02/10/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso e assistenze all'installazione degli impianti, posa telai porte interne	1	1	8	12	02/10/2020	13/10/2020
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	1	3	3	06/10/2020	08/10/2020
Realizzazione di controsoffitti e assistenze all'installazione degli impianti	1	1	4	6	14/10/2020	19/10/2020
Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione	1	4	4	6	09/10/2020	14/10/2020
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	1	3	3	20/10/2020	22/10/2020
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	1	4	6	23/10/2020	28/10/2020

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione pavimenti e rivestimenti in resina	1	1	5	7	27/10/2020	02/11/2020
Montaggio di porte interne	1	1	2	2	03/11/2020	04/11/2020
Rimozione di serramenti esterni	1	1	1	1	05/11/2020	05/11/2020
Montaggio di serramenti esterni	1	1	3	5	06/11/2020	10/11/2020
Completamento e collaudo di impianto di ventilazione forzata	1	2	1	1	11/11/2020	11/11/2020
Completamento impianto elettrici e collaudo/programmazione	1	4	2	2	12/11/2020	13/11/2020
Montaggio di apparecchi igienico sanitari e collaudo impianti	1	3	2	4	13/11/2020	16/11/2020
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	1	1	16/11/2020	16/11/2020
	1	1	5	7	18/11/2020	24/11/2020
Smobilizzo del cantiere	4	1	2	4	20/11/2020	23/11/2020
Pulizia generale dell'area di cantiere	6	1	1	1	23/11/2020	23/11/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA INTERNA PIANO TERRA
- 2) = ZONA INTERNA PIANO INTERRATO
- 3) = ZONA ESTERNA PORTICO E CORTILE INTERNO
- 4) = ZONA CORTILE INTERNO
- 5) = ZONA PORTICO OVEST
- 6) = CANTIERE
- 7) = PIANO TERRA E INTERRATO
- 8) = VECCHIO ABULATORIO


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = IMPRESA EDILE
- 2) = IMPIANTI MECCANICI
- 3) = IMPIANTI IDRAULICI
- 4) = IMPIANTI ELETTRICI
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

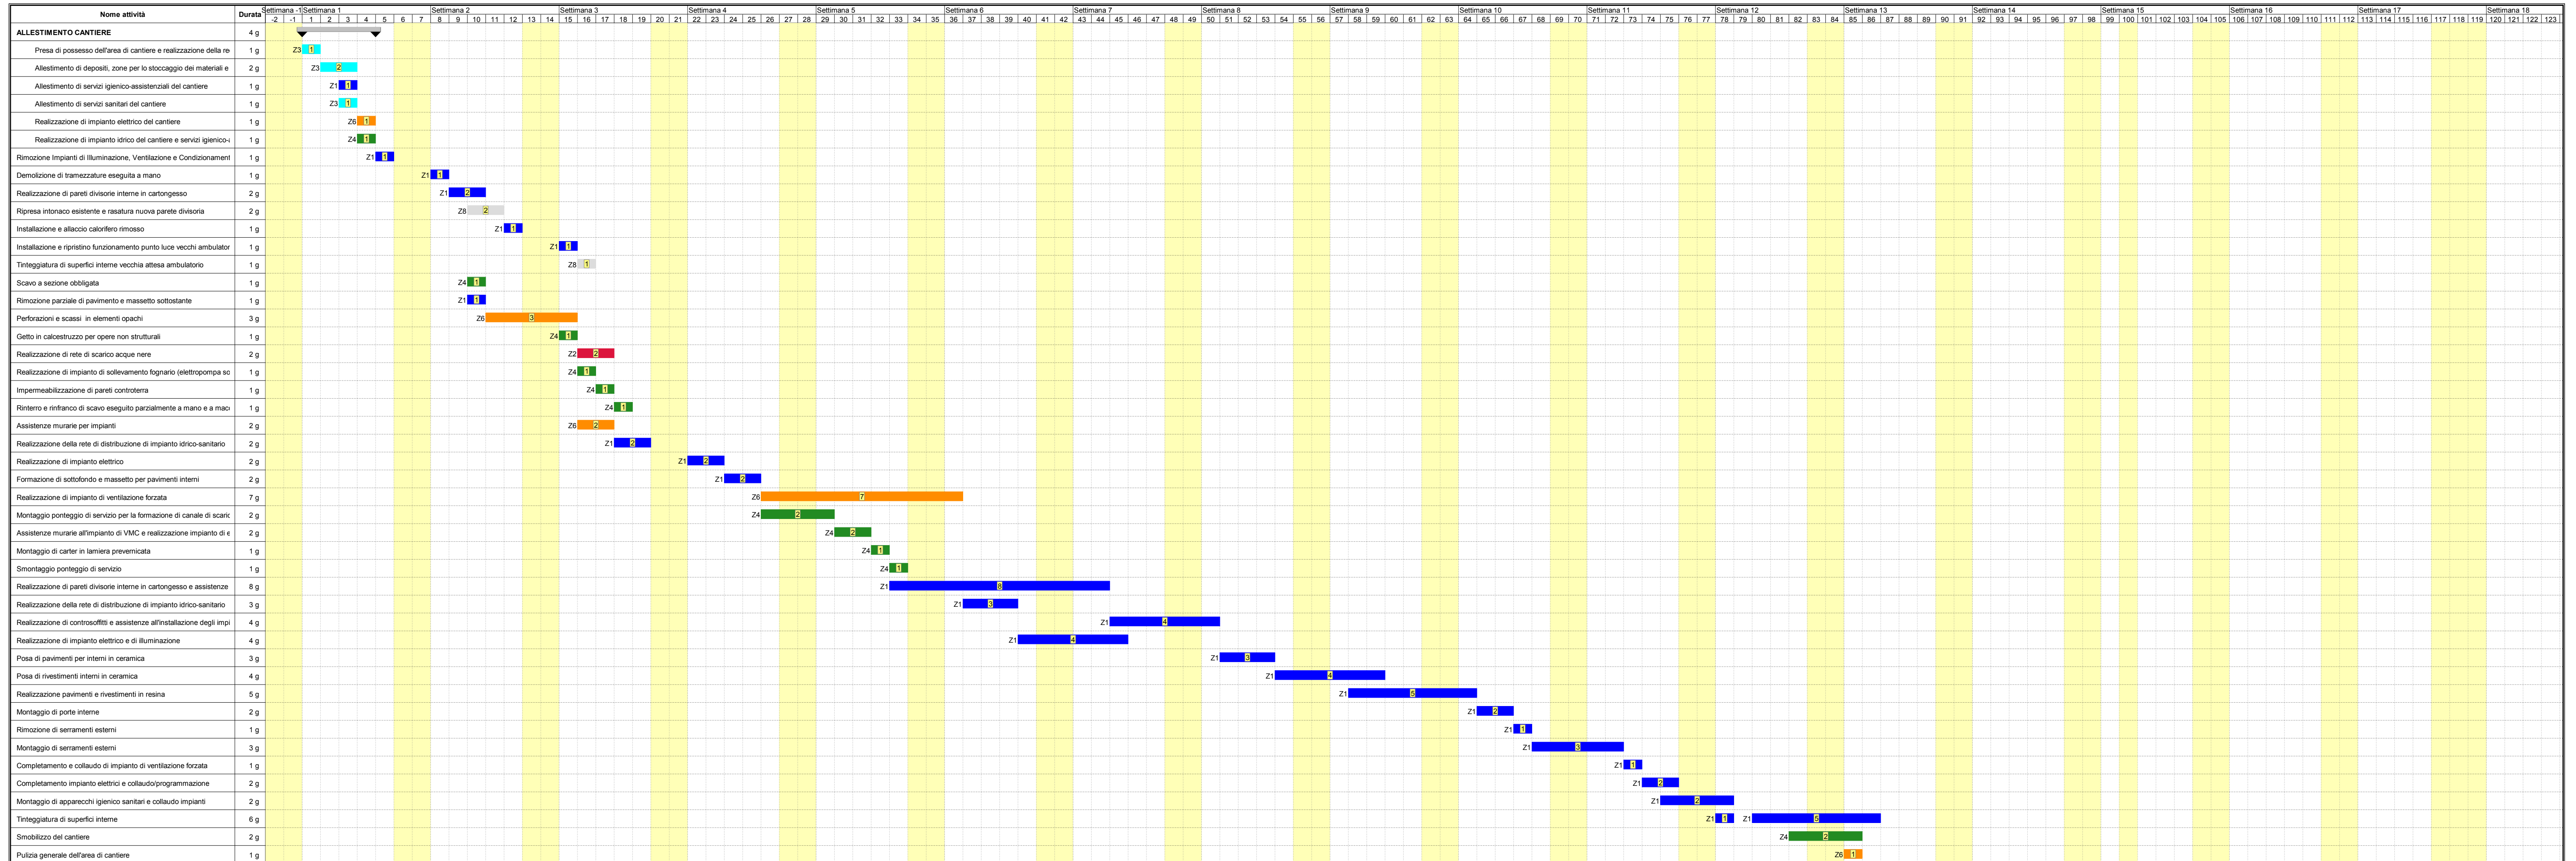

LEGENDA Zona:

- Z1 = ZONA INTERNA PIANO TERRA
- Z2 = ZONA INTERNA PIANO INTERRATO
- Z3 = ZONA ESTERNA PORTICO E CORTILE INTERNO
- Z4 = ZONA CORTILE INTERNO
- Z5 = ZONA PORTICO OVEST
- Z6 = CANTIERE
- Z7 = PIANO TERRA E INTERRATO
- Z8 = VECCHIO ABULATORIO
